

社会資本総合整備計画の事後評価書(案) についての意見募集(パブリックコメント)

■ 目的

社会資本総合整備計画「あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進(防災・安全)」の実施事業の完了に伴い、目標の実現状況などの事後評価書(案)がまとまりましたので広く意見を募集します。

■ 社会資本総合整備計画について

我孫子市では、国の財政支援制度「社会資本整備総合交付金」を活用して公共下水道の整備を進めています。この支援を受けるにあたっては、「社会資本総合整備計画」を策定し、これに基づいて事業を実施し、計画期間の終了時には、事業の進捗状況や評価指標の最終目標値の実現状況について、事後評価を実施することとされています。

今回のパブリックコメントは、社会資本総合整備計画の事後評価の実施にあたり、評価の透明性、客観性、公正さを確保するため、市民の皆様の意見をお聞きするものです。

■ 公表期間及び閲覧場所

期間 令和8年7月1日(水曜日)から7月31日(金曜日)まで

場所 市のホームページのほか、以下の場所でも閲覧できます。

下水道課、行政情報資料室(市役所本庁舎1階)、各行政サービスセンター、生涯学習センターアピスタ、湖北地区公民館、市民プラザ、各近隣センター、我孫子市民図書館布佐分館

■ 意見の提出方法及び期限

提出にあたっては、備え付けのパブリックコメント意見書に「住所」、「氏名」、「パブリックコメント件名」を明記し次のいずれかの方法で提出してください。口頭でのご意見はお受けできませんので、ご了承ください。

①下水道課へ郵送 ②下水道課へFAX ③ちば電子申請サービス ④下水道課の窓口
に持参 ⑤閲覧場所の窓口へ提出(各近隣センター、市民プラザ、湖北地区公民館は備え
付けの意見書投函箱に投函)してください。

提出期限 令和8年7月31日(金曜日)(必着)

提出先・問い合わせ 〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地
我孫子市役所 下水道課 経営係 TEL:04-7185-1111(内線20584)
FAX:04-7185-8013

■ いただいたご意見への対応

提出された意見と意見に対する市の考え方を、ホームページ及び上記の閲覧場所で公表します。また、意見に基づき内容を修正したときは、修正内容も公表します。

なお、提出された個々の意見に対して直接回答はいたしませんので、ご了承ください。

社会資本総合整備計画 事後評価書

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--|----|---|----|---|---|---|-----------|---|---|-------------------------|---|---|
| 計画の名称 | あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進（防災・安全） | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和02年度～令和02年度（1年間） | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | | |
| 交付対象 | 我孫子市 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 下水道整備により、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。 | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | | 20 | A | 20 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|--|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | R02 | R02 | R02 |
| 1 | 下水道ストックマネジメント計画に基づく修繕・改築に係る実施設計（第1期）の進捗率を0.0%（R02初）から100.0%（R02末）に増加させる。 | | | |
| | 下水道ストックマネジメント計画に基づき改築すべき施設に対する実施設計（第1期）進捗率 | 0% | 50% | 100% |
| | 修繕・改築に係る実施設計（第1期）済み管渠延長（m） / 修繕・改築に係る実施設計（第1期）対象管渠延長（m） | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
| 令和2年度第3次補正に伴い、令和3年度に予定していた事業を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事後評価等に関連する整備計画と一体的に実施する。 | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名／ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|-----|-----|---------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 我孫子市 | 直接 | 我孫子市 | — | 改築 | 下水道ストックマネジメ ント事業（改築更新） | 実施設計 | 我孫子市 | ■ | | | | | 20 | — | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

内部評価により実施した事後評価（案）に対し、市民の意見を反映させるため、パブリックコメントによる意見募集を行う。

令和8年7月

公表の方法

我孫子市ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

若松地区及び青山台地区において、污水管の改築更新を進めるため、実施設計を行った。
ストックマネジメント計画に基づく事業を進めることで、下水道施設のライフサイクルコストの低減に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の計画的な点検・調査、修繕・改築を実施することで、効率的な施設管理を図る。

| ○目標値の達成状況 | | |
|-----------|---------|---|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値／実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 最終目標値 | 100% |
| | 最終実績値 | 106% |
| | | 施設の調査を実施したところ、当初の想定よりも改築すべき施設延長が増加したため。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

社会資本総合整備計画 事後評価書

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----|---|-----|---|---|---|---|-----------|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称 | あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進（防災・安全） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和03年度～令和07年度（5年間） | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | |
| 交付対象 | 我孫子市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 下水道整備により、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 485 | A | 485 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|--|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | R03 | R05 | R07 |
| 1 | 計画期間内の下水道ストックマネジメント計画に基づく対策の実施率を0.0%（R03初）から100.0%（R07末）に増加させる。 | | | |
| | 下水道ストックマネジメント計画に基づき改築すべき施設に対する対策実施率 | 0% | 50% | 100% |
| | 下水道ストックマネジメント計画に基づく対策完了済み施設延長（m）／下水道ストックマネジメント計画に基づき改築すべき施設延長（m） | | | |
| 2 | 次期下水道ストックマネジメント計画の策定率を0.0%（R03初）から100.0%（R07末）に増加させる。 | | | |
| | 次期下水道ストックマネジメント計画の策定 | 0% | 0% | 100% |
| | 策定済みの計画数／策定すべき計画数 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | <input type="radio"/> | 国土強靱化を含む | <input type="checkbox"/> | 定住自立圏を含む | <input type="checkbox"/> | 連携中枢都市圏を含む | <input type="checkbox"/> | 流域水循環計画を含む | <input type="checkbox"/> | 地域再生計画を含む | <input type="checkbox"/> |
|-----|-----------|-----------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 我孫子市 | 直接 | 我孫子市 | 管渠（ | 改築 | 下水道ストックマネジメ | 管路施設改築工事 | 我孫子市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 452 | | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道ストックマネジメント計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 452 | |
| 水道・下水道事業 | A07-002 | 下水道 | 一般 | 我孫子市 | 直接 | 我孫子市 | — | 改築 | 下水道ストックマネジメ | 計画策定 | 我孫子市 | | | | ■ | ■ | 33 | | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道ストックマネジメント計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 33 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 485 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

内部評価により実施した事後評価（案）に対し、市民の意見を反映させるため、パブリックコメントによる意見募集を行う。

令和8年7月

公表の方法

我孫子市ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

若松地区において、污水管の改築工事を行うとともに、次期ストックマネジメント計画を策定した。ストックマネジメント計画に基づく事業を進めることで、下水道施設のライフサイクルコストの低減に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の計画的な点検・調査、修繕・改築を実施することで、効率的な施設管理を図る。

| ○目標値の達成状況 | | |
|-----------|---------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値／実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 最終目標値 | 100% |
| | 最終実績値 | 88% |
| 2 | 最終目標値 | 100% |
| | 最終実績値 | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

工法の見直し等、施工にあたって再検討が必要な箇所があることが判明し、次期計画にて実施するものとしたことにより、当初より事業量が減少した。

社会資本総合整備計画事後評価書（案）の
パブリックコメントに係る参考資料

令和8年7月


我孫子市 下水道課

【資料一覧】

- 資料1 社会資本整備総合交付金制度の概要
(国土交通省ホームページより)
- 資料2 社会資本総合整備計画「あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進（防災・安全）」
- 資料3 計画の定量的指標の根拠
- 資料4 社会資本総合整備計画「あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進（防災・安全）」の事業進捗状況
- 資料5 交付対象事業の概要
- 資料6 我孫子市社会資本総合整備計画事後評価実施要領

社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金


- ◇ **社会資本整備総合交付金**は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設。
- ◇ **防災・安全交付金**は、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取組み、地域における総合的な生活空間の安全確保の取組みを集中的に支援するため、平成24年度補正予算において創設。

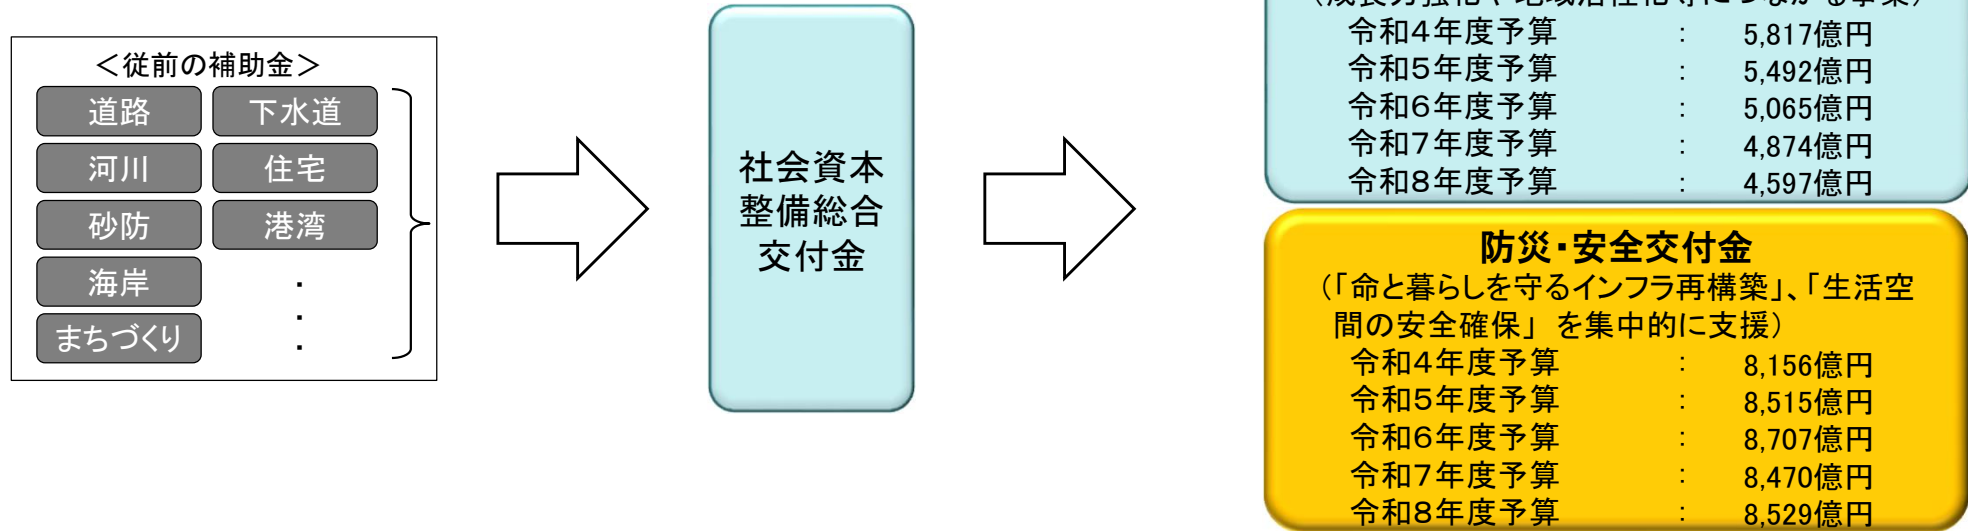

両交付金の概要

- ◇ 地方公共団体は、地域が抱える政策課題を自ら抽出し、定量的な指標による目標を設定した、おおむね3～5年の「社会資本総合整備計画」を作成。(国は整備計画に対して国費を配分)
- ◇ 計画へ配分された国費の範囲内で、地方公共団体が自由に計画内の各事業(要素事業)へ国費を充当。
- ◇ 基幹事業(道路、河川等の17事業)の効果を一層高めるソフト事業(効果促進事業)についても、一定の範囲内で創意工夫を生かして実施可能。
- ◇ 地方公共団体が、自ら整備計画の事前評価・事後評価を実施し、HP等により公表。

社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金の対象事業



住宅・社会資本の整備

効果促進事業

基幹事業

- 道路
- 港湾
- 河川
- 砂防
- 上下水道
- 海岸
- 都市公園
- 市街地
- 住宅
- 住環境整備
- 地域公共交通再構築
- 等

- 計画の目標実現のため基幹事業と一体となって、基幹事業の効果を一層高めるために必要な事業・事務
- 全体事業費の2割目途

(社会資本整備総合交付金の例)

- ・産業・観光振興等による活力ある地域の形成
例) 都市公園の整備
- 例) 港湾施設の整備



- ・民間投資を誘発する取組
例) PFI等を活用した下水汚泥固形燃料化施設等の導入



(防災・安全交付金の例)

- ・インフラ老朽化対策
例) 公園施設の改修
- ・生活空間の安全確保
例) 自転車通行空間の整備



- ・事前防災・減災対策
例) 流域治水対策(風水害・土砂災害への対策)

(社会資本整備総合交付金の例)

- ・観光情報の発信(観光案内情報板の整備、観光PR等)
例) 観光案内情報板の整備
- ・社会実験(シェアサイクル、道路の歩行者優先化等)
- ・計画検討・策定(住生活基本計画等)



(防災・安全交付金の例)

- 例) ハザードマップの作成・活用
- ・ハザードマップの作成・活用
- ・防災教育、防災訓練の実施
- ・災害時のための資機材整備(マンホールトイレ、可搬式ポンプ、災害用井戸等)
例) 防災訓練の実施
- ・遊具の修繕



※このほか、社会資本整備円滑化地籍整備事業(社会資本整備と地籍調査の連携を図り、社会資本のストック効果の最大化等を図る観点から行う地籍整備事業)等がある。

A 基幹事業


| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 我孫子市 | 直接 | 我孫子市 | - | 改築 | 下水道ストックマネジメント事業（改築更新） | 実施設計 | 我孫子市 | | | | | | 20 | - | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

社会資本総合整備計画（防災・安全）

| | | | |
|-------|-------------------------------------|------|------|
| 計画の名称 | あびこのうらおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進（防災・安全） | | |
| 計画の期間 | 令和02年度 ～ 令和02年度（1年間） | 交付対象 | 我孫子市 |

凡例

- 全体計画区域
- 下水道法による事業計画区域
- 既整備区域
- 既設幹線

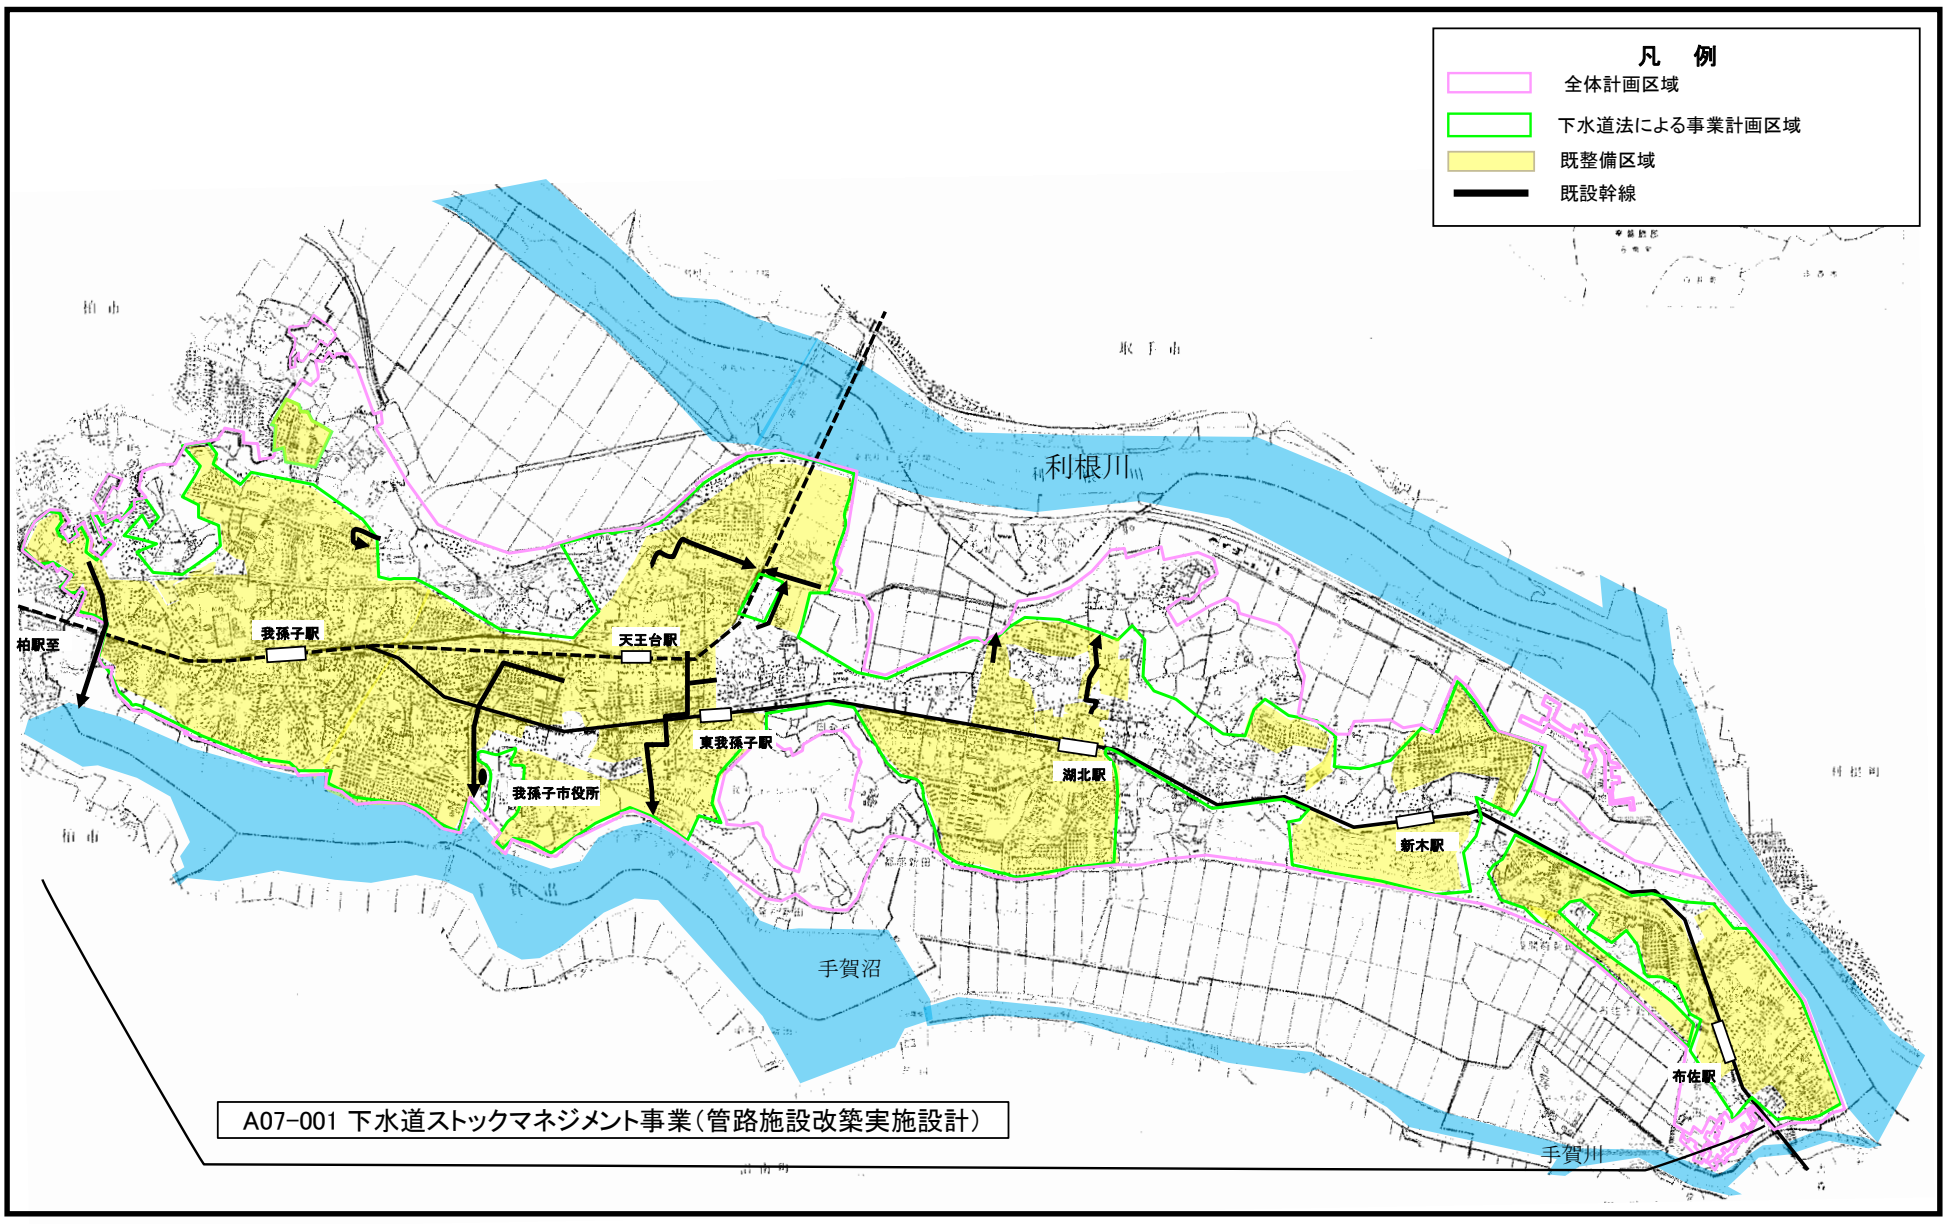

A07-001 下水道ストックマネジメント事業(管路施設改築実施設計)

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月15日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----|---|-----|---|---|---|---|-----------|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称 | あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進（防災・安全） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和03年度～令和07年度（5年間） | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | |
| 交付対象 | 我孫子市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 下水道整備により、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 485 | A | 485 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D） | 0 | % |


| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|--|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | R03 | R05 | R07 |
| 1 | 計画期間内の下水道ストックマネジメント計画に基づく対策の実施率を0.0%（R03初）から100.0%（R07末）に増加させる。 | | | |
| | 下水道ストックマネジメント計画に基づき改築すべき施設に対する対策実施率 | 0% | 50% | 100% |
| | 下水道ストックマネジメント計画に基づく対策完了済み施設延長（m）／下水道ストックマネジメント計画に基づき改築すべき施設延長（m） | | | |
| 2 | 次期下水道ストックマネジメント計画の策定率を0.0%（R03初）から100.0%（R07末）に増加させる。 | | | |
| | 次期下水道ストックマネジメント計画の策定 | 0% | 0% | 100% |
| | 策定済みの計画数／策定すべき計画数 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | <input type="radio"/> | 国土強靱化を含む | <input type="checkbox"/> | 定住自立圏を含む | <input type="checkbox"/> | 連携中枢都市圏を含む | <input type="checkbox"/> | 流域水循環計画を含む | <input type="checkbox"/> | 地域再生計画を含む | <input type="checkbox"/> |
|-----|-----------|-----------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | |
|----------------------|---------|-----------------|------|------|------|------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 我孫子市 | 直接 | 我孫子市 | 管渠（ | 改築 | 下水道ストックマネジメ | 管路施設改築工事 | 我孫子市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 452 | | 策定済 | | |
| | | 下水道ストックマネジメント計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 452 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道・下水道事業 | A07-002 | 下水道 | 一般 | 我孫子市 | 直接 | 我孫子市 | — | 改築 | 下水道ストックマネジメ | 計画策定 | 我孫子市 | | | | | ■ | ■ | 33 | 策定済 | | |
| | | 下水道ストックマネジメント計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 33 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | 485 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

社会資本総合整備計画（防災・安全）

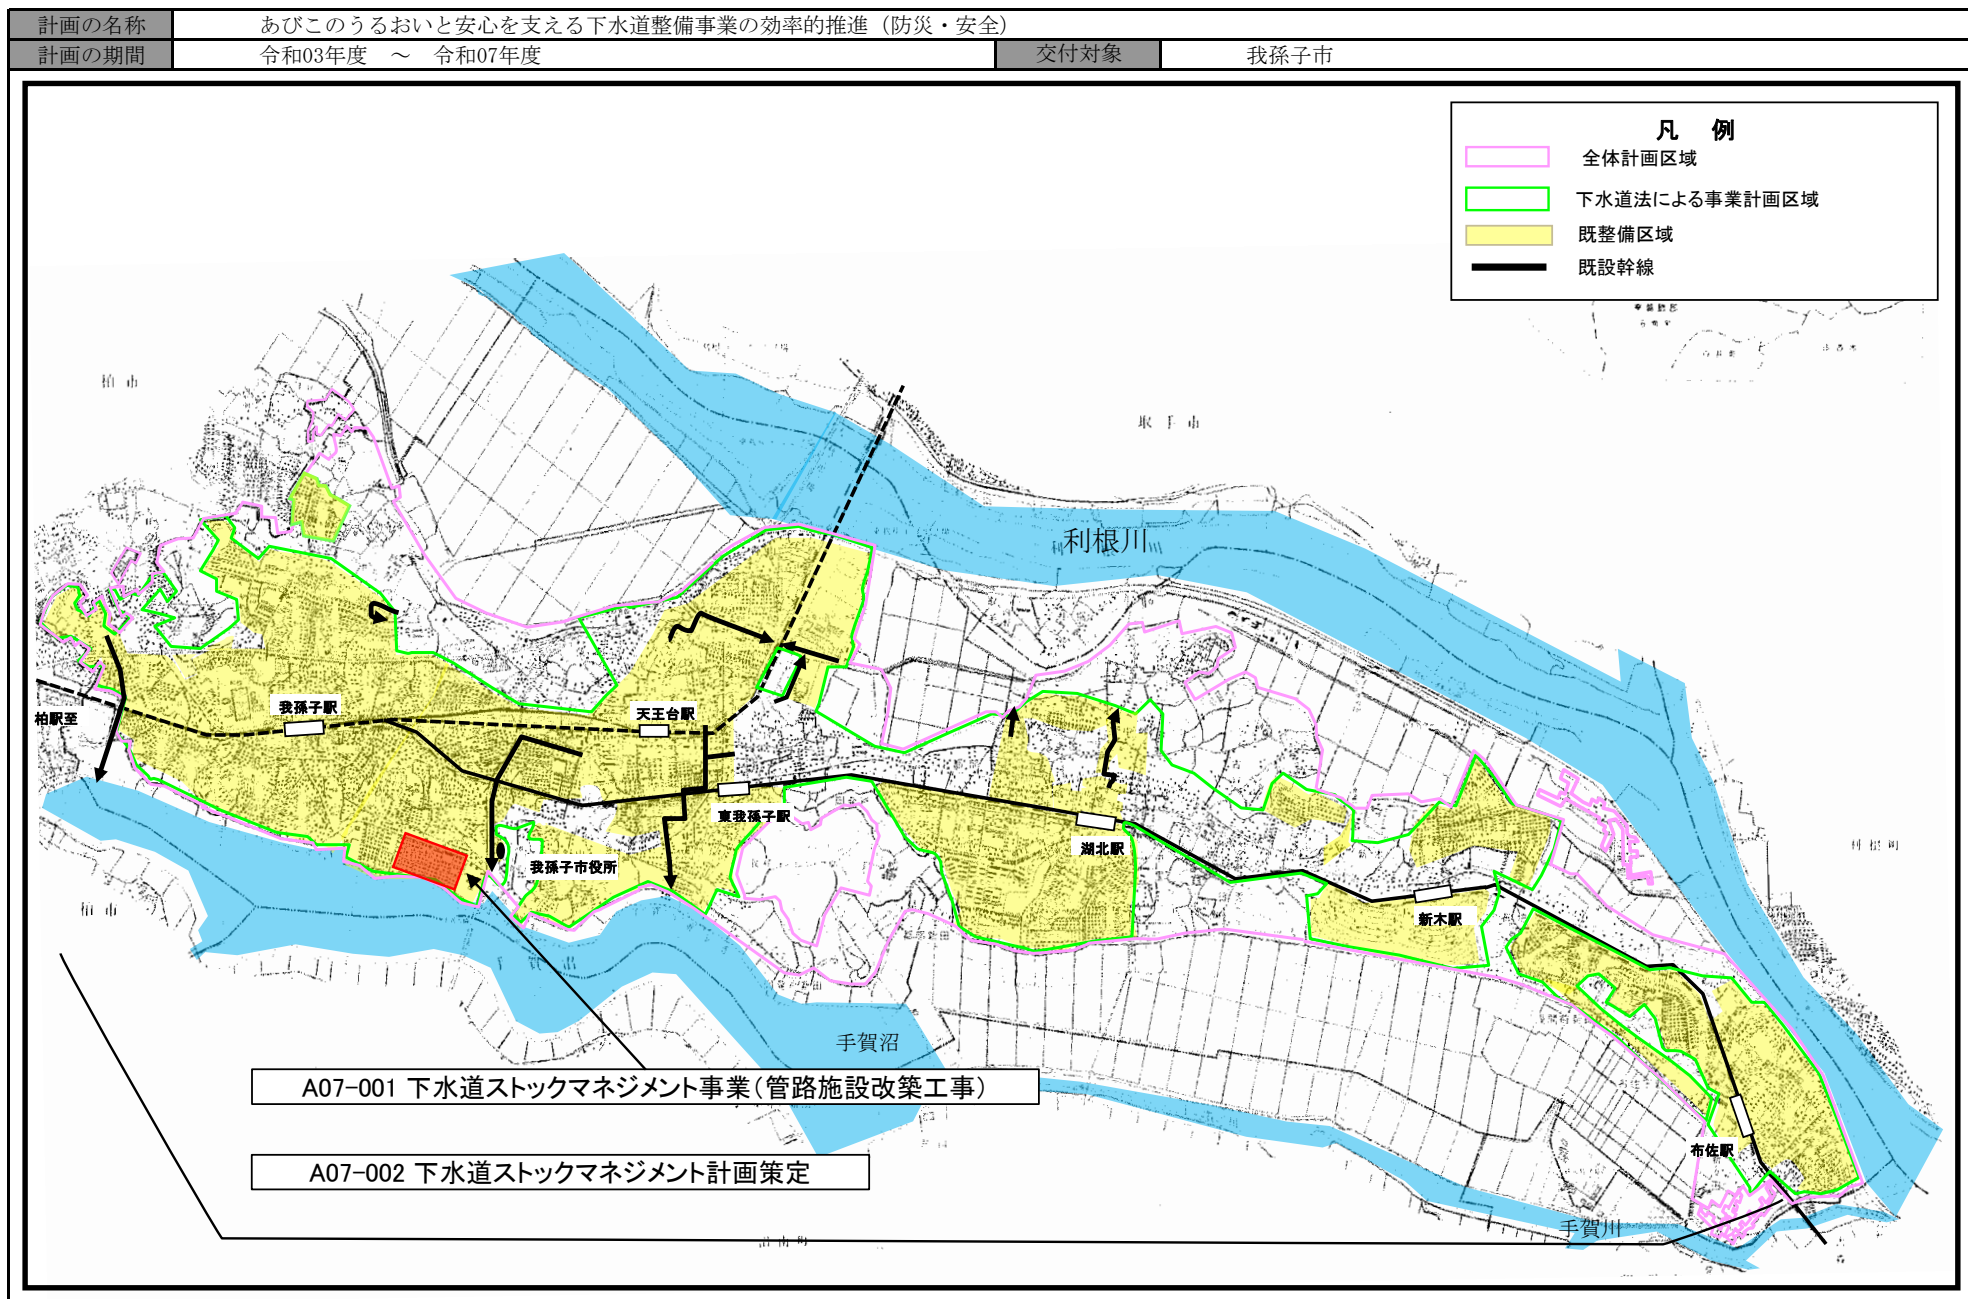


計画の定量的指標の根拠

資料3

◆指標（計画期間：令和2年度～令和2年度）

| 区 分 | 現況値 (令和2年度当初) | 目標値 (令和2年度末) |
|-------|------------------|-----------------|
| 事業進捗率 | 0.0% | 100.0% |

R2(当初) 修繕・改築に係る実施設計（第I期）済み管渠延長（m） 0 / 修繕・改築に係る実施設計（第I期）対象管渠延長（m） 1,890 = 0.0%



若松地区及び青山台地区の汚水管の改築工事を行うため、その設計を実施

R2(目標) 修繕・改築に係る実施設計（第I期）済み管渠延長（m） 1,890 / 修繕・改築に係る実施設計（第I期）対象管渠延長（m） 1,890 = 100.0%

R3※(実績) 修繕・改築に係る実施設計（第I期）済み管渠延長（m） 1,994 / 修繕・改築に係る実施設計（第I期）対象管渠延長（m） 1,890 = 105.5%

※R2年度の事業をR3年度に繰り越して実施した。

計画の定量的指標の根拠


資料3

◆指標（計画期間：令和3年度～令和7年度）

A07-001 下水道ストックマネジメント事業（改築更新）

| 区 分 | 現況値 (令和3年度当初) | 目標値 (令和7年度末) |
|-------|------------------|-----------------|
| 事業進捗率 | 0.0% | 100.0% |

R3(当初) 下水道ストックマネジメント計画に基づく対策完了済み施設延長 0m / 下水道ストックマネジメント計画に基づき改築すべき施設延長 1,890m = 0.0%



若松地区の污水管の改築工事を実施


R7(目標) 下水道ストックマネジメント計画に基づく対策完了済み施設延長 1,890m / 下水道ストックマネジメント計画に基づき改築すべき施設延長 1,890m = 100.0%

R7(実績) 下水道ストックマネジメント計画に基づく対策完了済み施設延長 1,670m / 下水道ストックマネジメント計画に基づき改築すべき施設延長 1,890m = 88.4%

A07-002 下水道ストックマネジメント計画策定（改築更新）

| 区 分 | 現況値 (令和3年度当初) | 目標値 (令和7年度末) |
|-------|------------------|-----------------|
| 事業進捗率 | 0.0% | 100.0% |

R3(当初) 策定済みの計画数 0 / 策定すべき計画数 1 = 0.0%



我孫子市公共下水道ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）を策定

R7(目標) 策定済みの計画数 1 / 策定すべき計画数 1 = 100.0%



R7(実績) 策定済みの計画数 1 / 策定すべき計画数 1 = 100.0%

社会資本総合整備計画「あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進(重点計画)」の事業進捗状況

資料4

| 種別 | 事業番号 | 区分 | 要素事業名 | 事業内容(延長、面積等) | | 事業実施期間(年度) | | | | | | 事業費(百万円) | | |
|----|---------|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----------|-------|-------|
| | | | | 計画 | 実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 計画 | 実績 | |
| 汚水 | A07-001 | 改築 | 下水道ストックマネジメント事業(改築更新) | 汚水管改築 L=1,890m | 汚水管改築 L=1,670m R8以降も引き続き実施 | | | | | | | | 472.0 | 215.9 |
| 汚水 | A07-002 | 改築 | 下水道ストックマネジメント計画策定(改築更新) | 計画策定 1式 | 計画策定 1式 事業完了 | | | | | | | | 33.0 | 21.9 |
| 計 | | | | | | | | | | | | 505.0 | 237.8 | |

※事業費の計画値は計画策定当初の見込み額です。

 ... 実施期間(計画)
 ... 実施期間(実績)

A07-001 下水道ストックマネジメント事業（改築更新）

（若松地区）

1. 概要

我孫子市では、令和6年度末時点で約 373 kmの污水管を保有しており、その老朽化率は比較的高い水準にあります。今後も安全に下水道を使い続けるためには、老朽化した施設を適切に維持管理し、改築・更新を行っていく必要があります。

下水道ストックマネジメント事業とは、長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、優先順位付けを行ったうえで、施設の点検・調査・修繕・改築を実施し、下水道施設全体を対象とした施設管理を最適化することを目的としています。


★R3 年度に若松地区の污水管の改築実施設計、R4～7 年度に改築工事を行いました。

2. 事業内容（R2～R7）

事業概要： 污水管改築実施設計 一式
 污水管改築工事 L=1,670m

事業費： 215,857,400 円(国費 53,896,000 円)

3. 箇所図

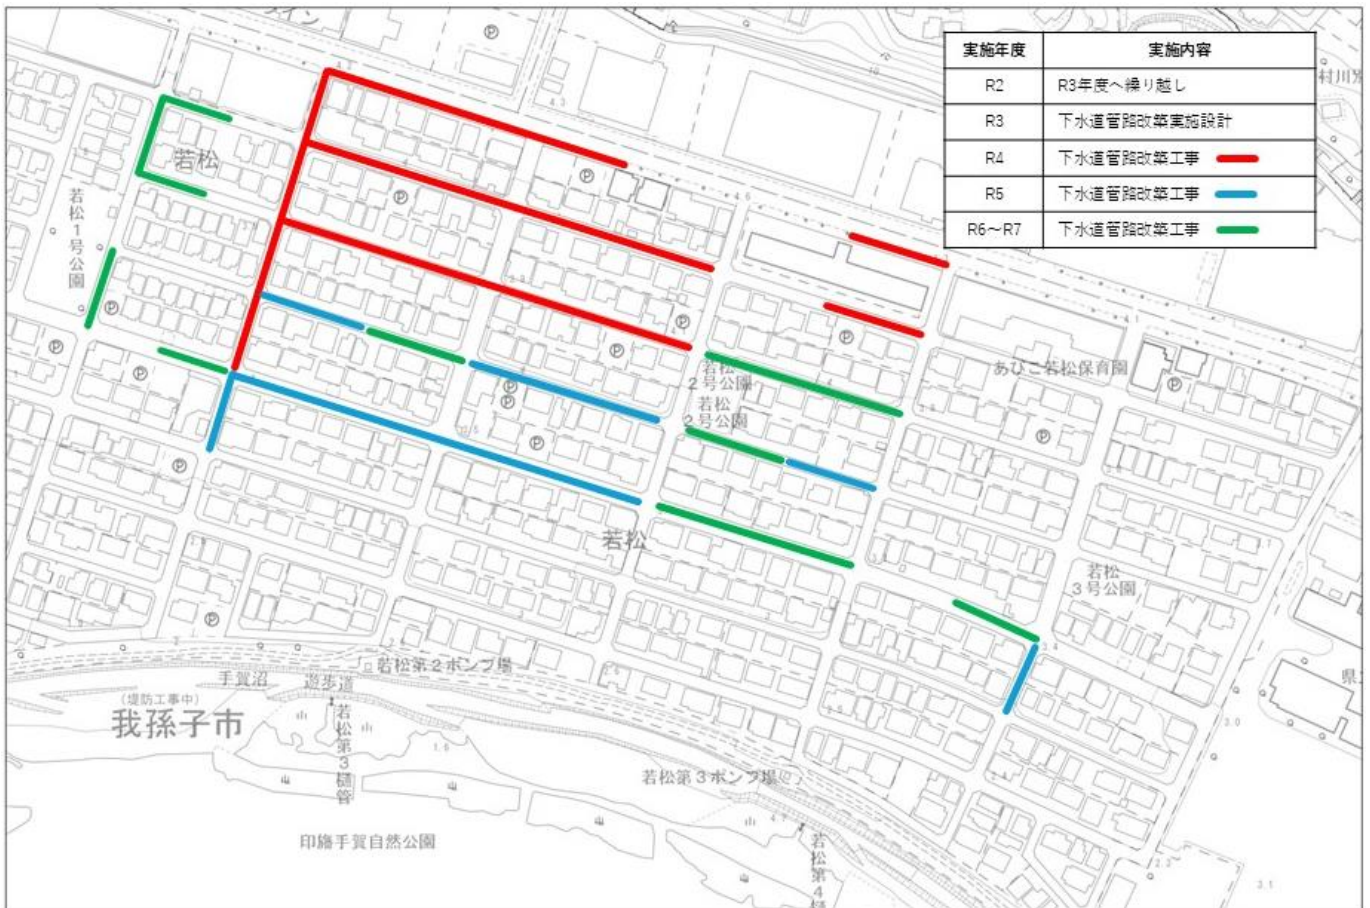

A07-002 下水道ストックマネジメント計画策定（改築更新）

1. 概 要

我孫子市の下水道施設は今後急速に老朽化することが見込まれる一方、人口減少社会の到来により下水道使用料収入が減少していく中で、持続可能な下水道事業を実施するため、下水道施設を計画的かつ効率的に管理することを目指し、我孫子市公共下水道ストックマネジメント計画を策定しています。

本計画は、R3～7年度の5年間を計画期間（第Ⅰ期）としており、引き続き、改築・更新事業を推進するため、R8～12年度の5年間を対象とした第Ⅱ期下水道ストックマネジメント計画を策定しました。

★R7年度に次期下水道ストックマネジメント計画を策定しました。

2. 事業内容（R7）

事業概要： 下水道ストックマネジメント計画策定 一式

事業費： 21,890,000円（国費4,950,000円）

我孫子市社会資本総合整備計画事後評価実施要領

(趣旨)

第 1 条 この要領は、社会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22 年 3 月 26 日国官会第 2317 号国土交通事務次官通知。以下「国要綱」という。）第 8 第 1 項の規定により市が作成した社会資本総合整備計画（以下「整備計画」という。）について、国要綱第 10 第 1 項の規定により当該整備計画期間の終了時に行う評価（以下「事後評価」という。）を実施することに関し、必要な事項を定める。

(評価の実施時期)

第 2 条 事後評価の実施時期は、整備計画期間の終了後又は整備計画期間の最終年度中とする。

(評価事項)

第 3 条 事後評価は、次に掲げる事項について行うものとする。

- (1) 社会資本整備総合交付金を充てた要素事業（国要綱第 3 第 3 号に規定する要素事業をいう。以下同じ。）の進捗状況
- (2) 事業効果の発現状況
- (3) 評価指標の最終目標値の実現状況
- (4) 今後の方針

(意見の聴取)

第 4 条 市長は、評価の透明性、客観性及び公正性を確保するため、事後評価の案について、我孫子市パブリックコメント手続実施要綱（平成 18 年告示第 22 号）に基づき、パブリックコメントを実施し、市民から意見を聴くものとする。

2 市長は、前項の規定によるほか、必要に応じ、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の 4 第 3 項に規定する附属機関又は学識経験者等の第三者の意見を聴くことができる。

3 社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の事後評価手法について、別に定めがある場合は、前 2 項の規定は適用しない。

(今後の方針の決定)

第5条 市長は、今後の方針を決定するに当たっては、前条の規定により提出され、又は聴取した意見を可能な限り考慮するものとする。

(公表)

第6条 市長は、市ホームページ等を活用し、事後評価の結果を公表するものとする。

附 則

この要領は、平成29年8月1日から施行する。
